

SO 149

D.1.1

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
	Stavbu zajišťuje Závod Praha Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společníci ve sdružení		SG_Velké projekty_BIM 2020 zastoupené		
SUDOP PRAHA a.s. Hlavní inženýr projektu: Ing. Roman Petřík		Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 telefon: +420 267 094 111		
				

Správce:	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz	Vedoucí týmu:	Asistent vedoucího týmu:
		ING. ROMAN PETŘÍK	ING. PAVEL MICHL
			Specialista profese:
			-


Zpracovatel částí:	projektová, průzkumná a konzultační společnost PUDIS a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 tel.: +420 267 004 111, www.pudis.cz, info@pudis.cz
	

Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. ZDEŇKA BOLEHOVSKÁ	ING. MICHAL TUREK	BC. ZARRINA UTEULINA	ING. MICHAL TUREK

Název akce:	Číslo smlouvy:	
D11 1108 Jaroměř - Trutnov VD-ZDS + TP + AD	22-014.250	
	Projektový stupeň:	
Část:	VD-ZDS	
	Datum:	
D.1.1 OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VČETNĚ PROPUSTKŮ SO 149 PŘÍJEZD K RETENČNÍ NÁDRŽI KM 131,2	11/2024	
	Číslo části:	
Název přílohy:	D.1.1	
	Měřítko:	Počet formátů:
	-	3xA4
KONTROLNÍ BODY	Číslo přílohy:	
	6	

Schéma vytyčovacíh bodů

XX,XXX XXX

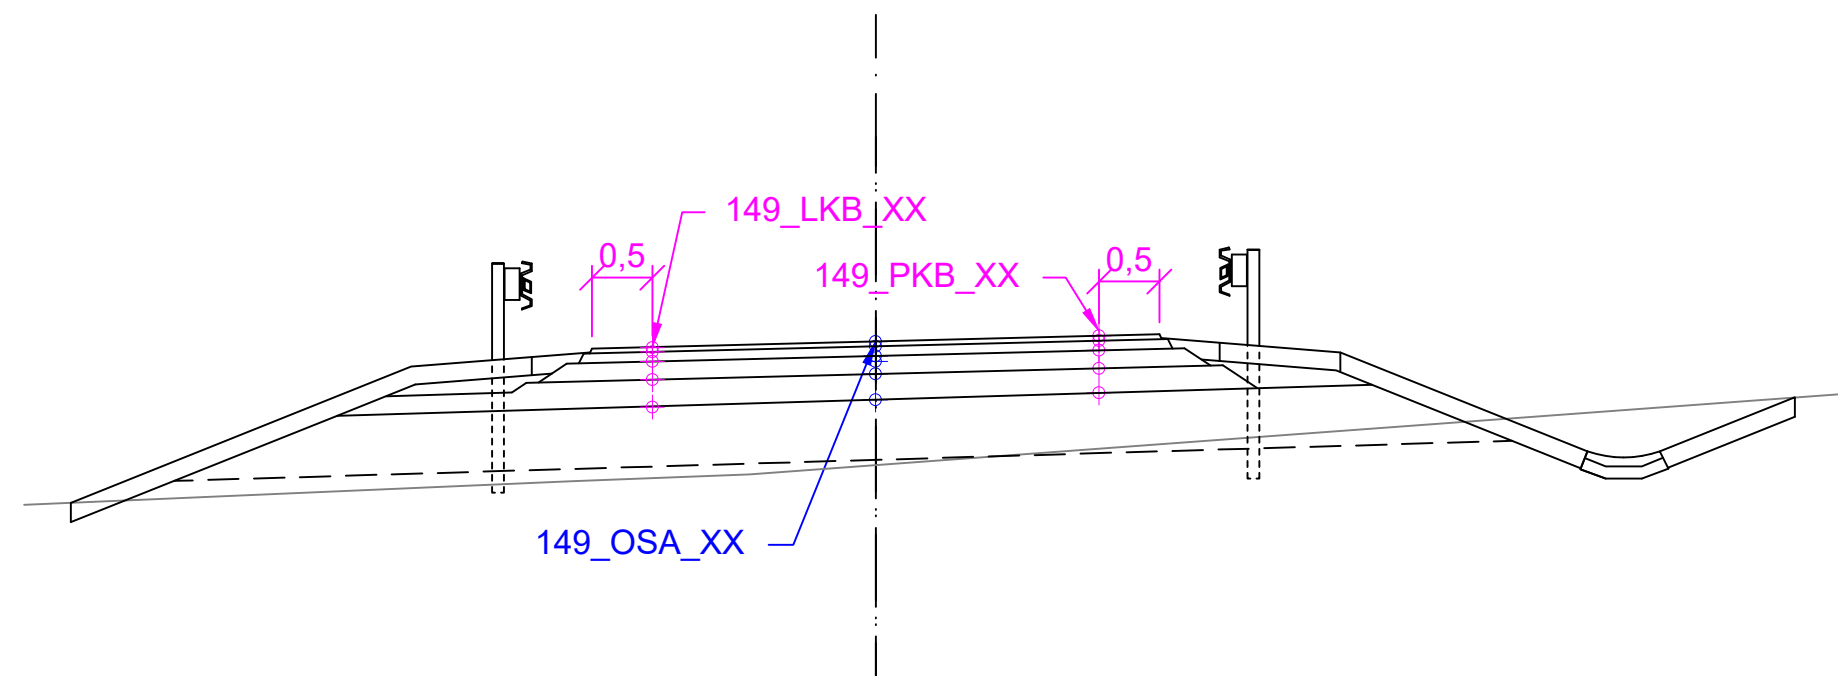

VÝPIS KONTROLNÍCH BODŮ SO 149

L_KB - VLEVO 0,5 m dovnitř od hrany zpevnění (TRASA - 149A)

staničení	CIS	Y	X	Z - ACO 11	Z - ACP 16+	Z - ŠDa	Z - ŠDb	Z - pláň
1,750	149A_LKB_2	631157,421	1010059,034	494,997	494,957	494,907	494,757	494,481
20,000	149A_LKB_20	631172,560	1010064,303	496,755	496,715	496,665	496,515	496,284
40,000	149A_LKB_40	631168,641	1010082,399	499,142	499,102	499,052	498,902	498,671
60,000	149A_LKB_60	631160,740	1010100,780	499,658	499,618	499,568	499,418	499,183
80,000	149A_LKB_80	631153,210	1010119,300	499,658	499,618	499,568	499,418	499,183
85,130	149A_LKB_85	631151,280	1010124,040	499,654	499,614	499,564	499,414	499,179

OSA (TRASA - 149A)

staničení	CIS	Y	X	Z - ACO 11	Z - ACP 16+	Z - ŠDa	Z - ŠDb	Z - pláň
1,750	149A_OSA_2	631163,525	1010049,921	495,007	494,967	494,917	494,767	494,518
20,000	149A_OSA_20	631174,373	1010063,907	496,800	496,760	496,710	496,560	496,340
40,000	149A_OSA_40	631170,354	1010083,096	499,190	499,150	499,100	498,950	498,726
60,000	149A_OSA_60	631162,823	1010101,624	499,710	499,670	499,620	499,470	499,250
80,000	149A_OSA_80	631155,292	1010120,152	499,710	499,670	499,620	499,470	499,250
85,130	149A_OSA_85	631153,361	1010124,901	499,710	499,670	499,620	499,470	499,246

P_KB - VPRAVO 0,5 m dovnitř od hrany zpevnění (TRASA - 149A)

staničení	CIS	Y	X	Z - ACO 11	Z - ACP 16+	Z - ŠDa	Z - ŠDb	Z - pláň
1,750	149A_PKB_2	631167,976	1010043,275	495,017	494,977	494,927	494,777	494,556
20,000	149A_PKB_20	631176,181	1010063,513	496,848	496,808	496,758	496,608	496,395
40,000	149A_PKB_40	631172,067	1010083,796	499,235	499,195	499,145	498,995	498,782
60,000	149A_PKB_60	631164,900	1010102,470	499,770	499,730	499,680	499,530	499,317
80,000	149A_PKB_80	631157,380	1010121,000	499,770	499,730	499,680	499,530	499,318
85,130	149A_PKB_85	631155,450	1010125,730	499,766	499,726	499,676	499,526	499,314

L_KB - VLEVO 0,5 m dovnitř od hrany zpevnění (TRASA - 149B)

staničení	CIS	Y	X	Z - ACO 11	Z - ACP 16+	Z - ŠDa	Z - ŠDb	Z - pláň
2,550	149B_LKB_3	631165,873	1010101,089	499,563	499,523	499,473	499,323	499,042
15,630	149B_LKB_16	631179,600	1010101,920	499,670	499,630	499,580	499,430	499,194

OSA (TRASA - 149B)

staničení	CIS	Y	X	Z - ACO 11	Z - ACP 16+	Z - ŠDa	Z - ŠDb	Z - pláň
2,550	149B_OSA_3	631168,276	1010094,985	499,730	499,690	499,640	499,490	499,239
15,630	149B_OSA_16	631180,444	1010099,775	499,730	499,690	499,640	499,490	499,263

P_KB - VPRAVO 0,5 m dovnitř od hrany zpevnění (TRASA - 149B)

staničení	CIS	Y	X	Z - ACO 11	Z - ACP 16+	Z - ŠDa	Z - ŠDb	Z - pláň
2,550	149B_PKB_3	631170,497	1010089,342	499,879	499,839	499,789	499,639	499,421
15,630	149B_PKB_16	631181,290	1010097,630	499,785	499,745	499,695	499,545	499,332
